


KELONGGARAN WAKTU PROYEK

Week 10 - 11

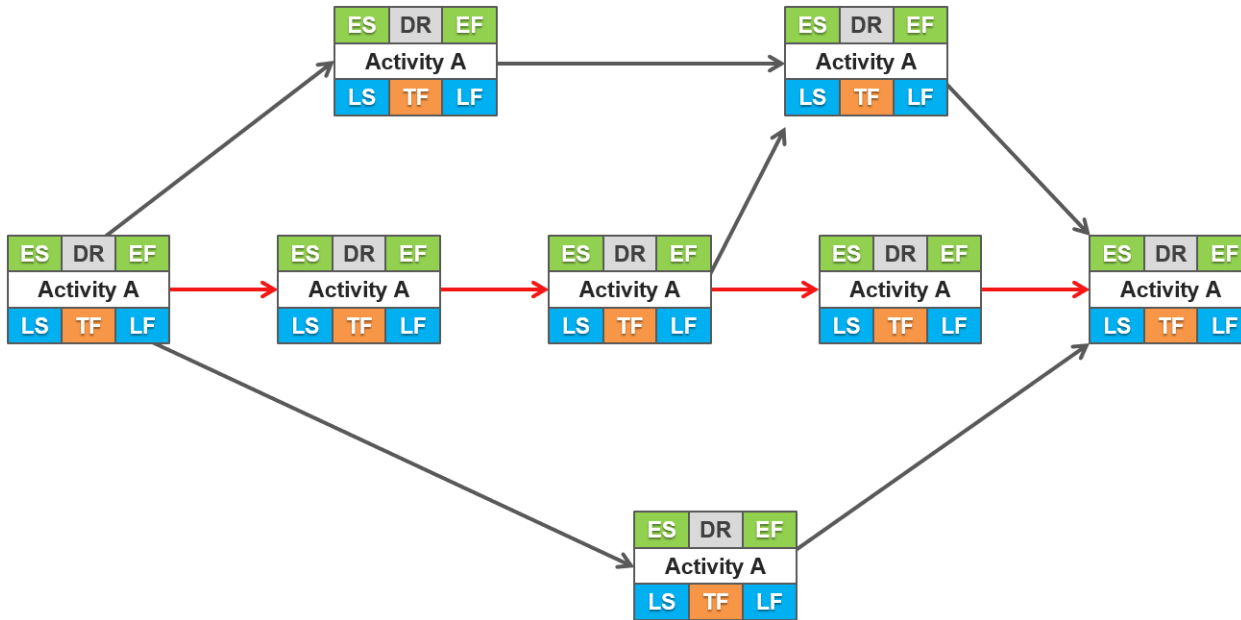

ES	DR	EF
Task Name		
LS	TF	LF

ES = Earliest start

DR = Duration

EF = Earliest finish

TF = Total Float

LS = Latest start

LF = Latest finish

Latihan Soal

Di bawah ini merupakan rencana anggaran dan progress aktual pengerjaan Proyek A dari tim yang anda pimpin. Proyek direncanakan selesai dalam 1 tahun.

Bulan ke-	1	2	3	4	5	...	12
Budget (dalam juta rupiah)	100	150	230	350	420	...	2000
Progress (dalam %)	10	18	25	32	56

*Anggaran dan progress disajikan secara *komulatif*

Saat ini, proyek sudah berjalan hingga bulan ke-5, dan anda sebagai Manajer Proyek akan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja tim anda. Total anggaran yang dihabiskan sampe bulan ke-5 adalah Rp 400.000.000,-. Bagaimana anda menyimpulkan hasil kerja tim anda sampai bulan ke-5? Berikan alasannya secara singkat dan jelas! [*penjelasan harus berdasarkan data kuantitatif.]

*kinerja proyek dinilai dari aspek *cost* dan *schedule*
